資料10

配送対象校の配膳室（改修校）の現況

学校名	想定改修時期	調理室面積（㎡）	児童生徒数（R6）
吉見小学校	直前の夏	143	244
市田小学校	直前の夏	180	152
長井小学校	直前の夏	134	239
妻沼小学校	要調整	112	267
妻沼西南小学校	要調整	150	115
大里中学校	直前の夏	204	218
妻沼東中学校	要調整	149	301
妻沼西中学校	要調整	149	230

吉見小学校

現配送校	改修校
	● （直前の夏）



①東面



②西面（想定搬入口）



③アスファルト舗装




④構内進入口




凡例	
←	構内車両動線想定
	配膳室範囲


吉見小学校

【改修内容】
・調理室内調理機器等撤去処分
・搬入口扉、段差改修
・三和土（プラットフォーム）拡張
・撤去跡 床等補修
・搬入路のアスファルト舗装
・棚や作業台等は撤去するか再利用するかを改修前に学校と調整して決定すること。
※既存の小荷物昇降機は引き続き活用

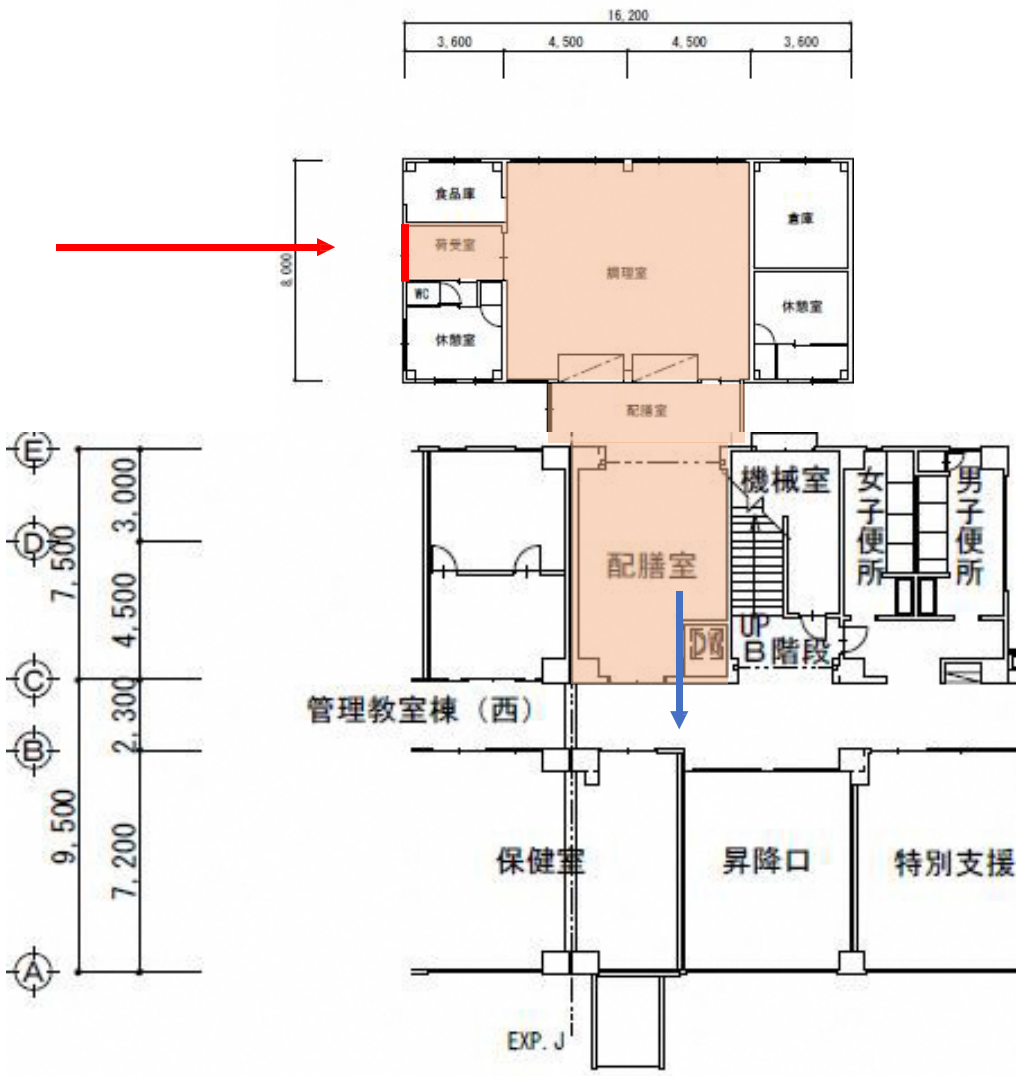

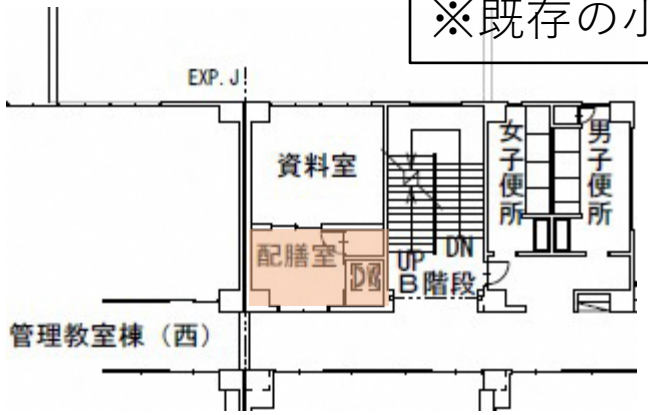

2階

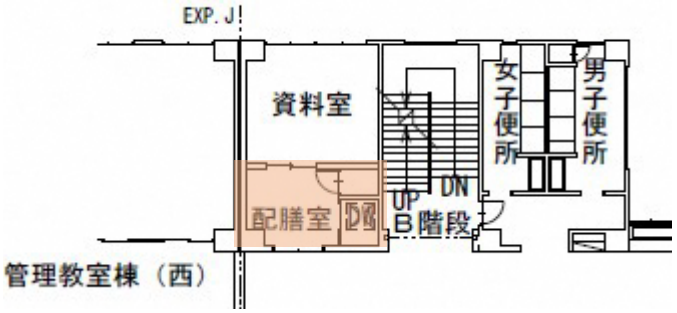

3階

凡例	
	想定コンテナ搬入口
	構内車両動線想定
	配膳室から教室等への動線想定
	配膳室範囲

市田小学校

現配送校	改修校
	● （直前の夏）



①西面（想定搬入口）



②想定搬入口



③構内進入口




④配膳室内




凡例	
←	構内車両動線想定
	配膳室範囲

市田小学校

【改修内容】
・調理室内調理機器等撤去処分
・搬入口扉、段差改修
・三和土（プラットフォーム）拡張
・撤去跡 床等補修
・棚や作業台等は撤去するか再利用するかを改修前に学校と調整して決定すること。

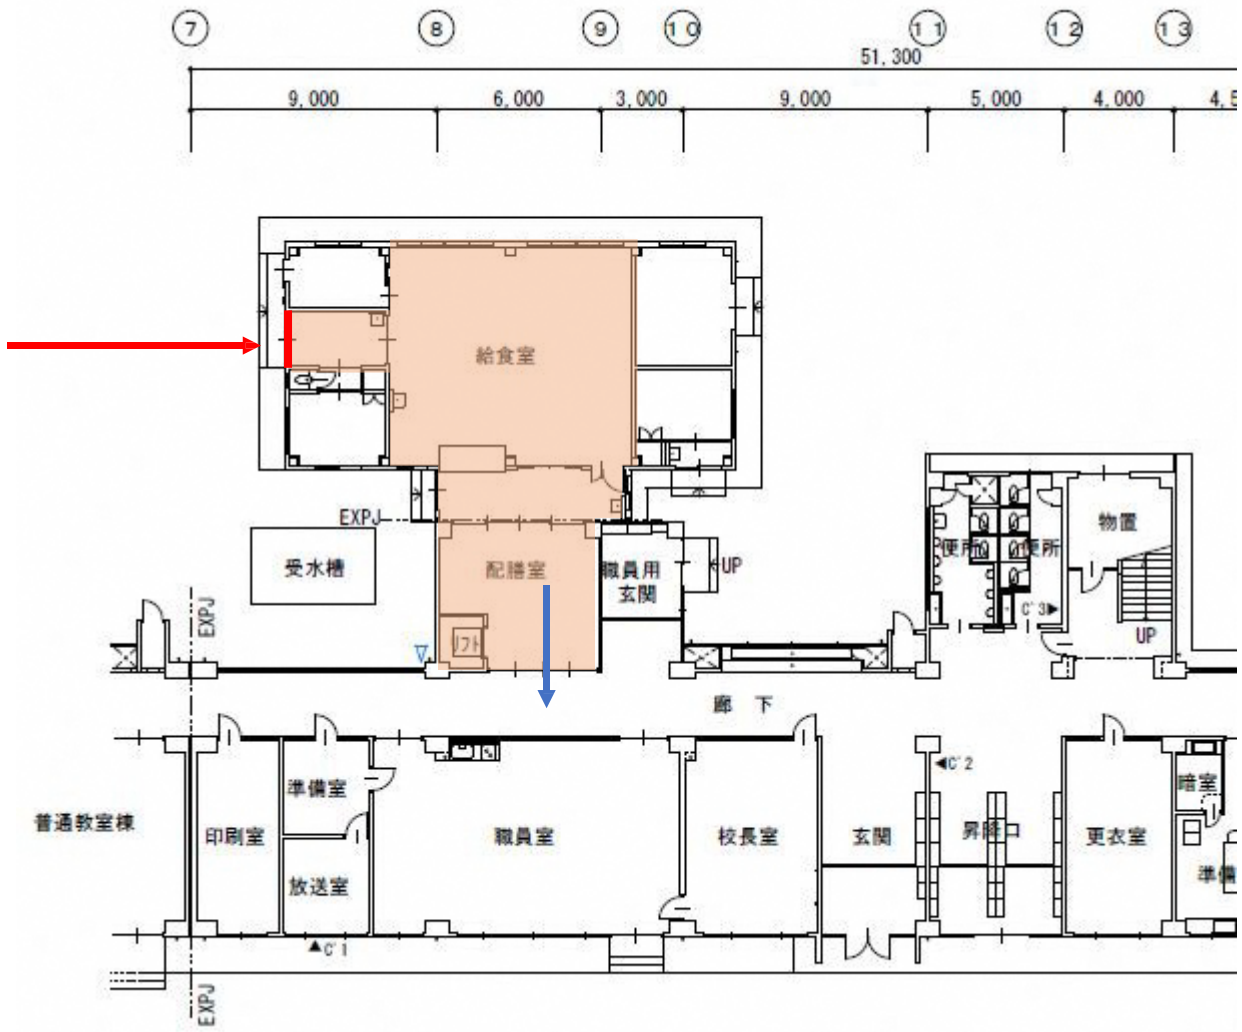



凡例	
	想定コンテナ搬入口
	構内車両動線想定
	配膳室から教室等への動線想定
	配膳室範囲

長井小学校

現配送校	改修校
	●（直前の夏）



①構内進入口



②西面（想定搬入口）



③現調理場内部




④現配膳室内部



凡例	
←	構内車両動線想定
	配膳室範囲

長井小学校

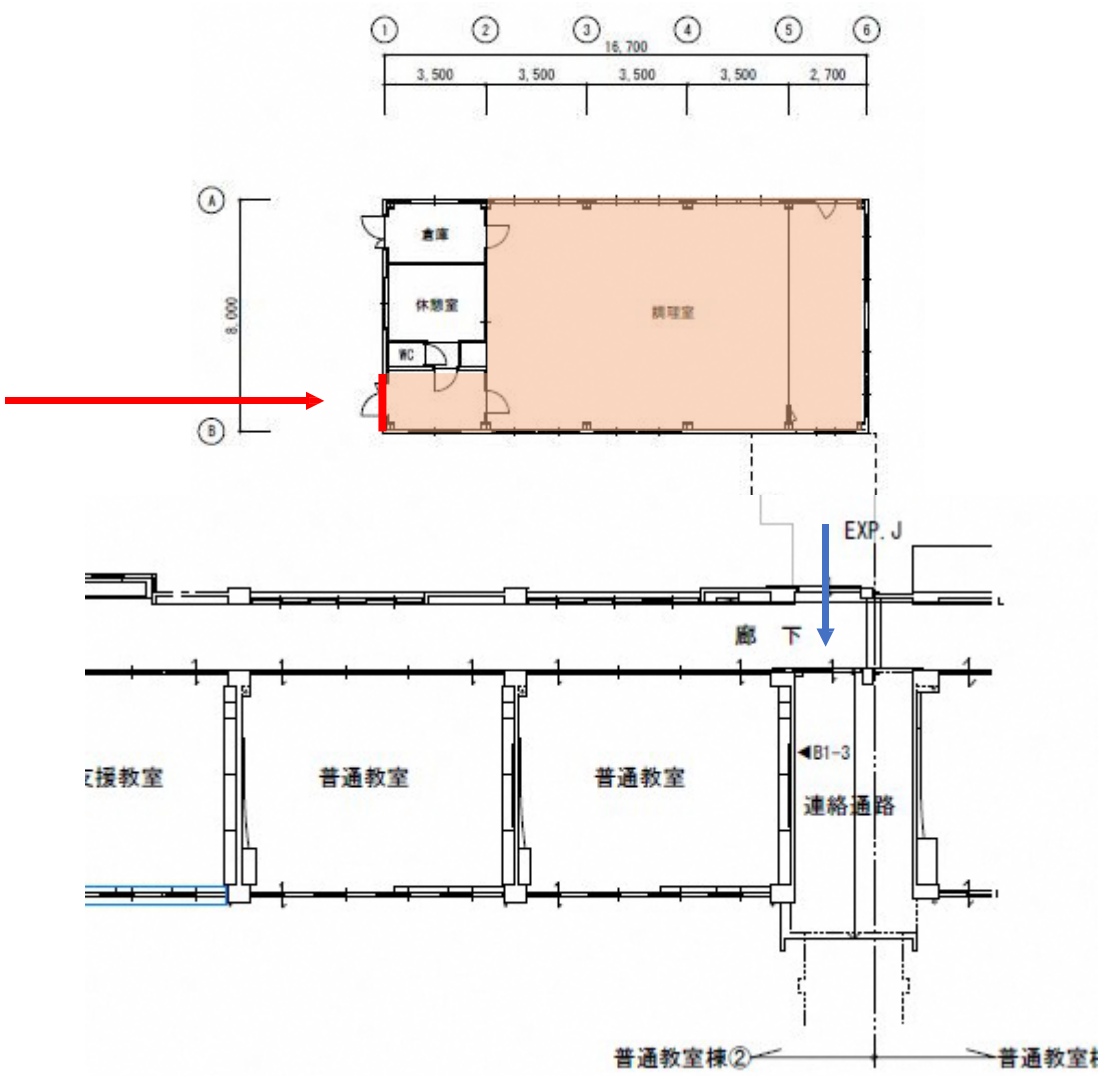


【改修内容】
- 調理室内調理機器等撤去処分
- 搬入口扉、段差改修
- 三和土（プラットフォーム）拡張
- 撤去跡 床等補修
- 棚や作業台等は撤去するか再利用するかを改修前に学校と調整して決定すること。

凡例	
	想定コンテナ搬入口
	構内車両動線想定
	配膳室から教室等への動線想定
	配膳室範囲

妻沼小学校

現配送校	改修校
	○

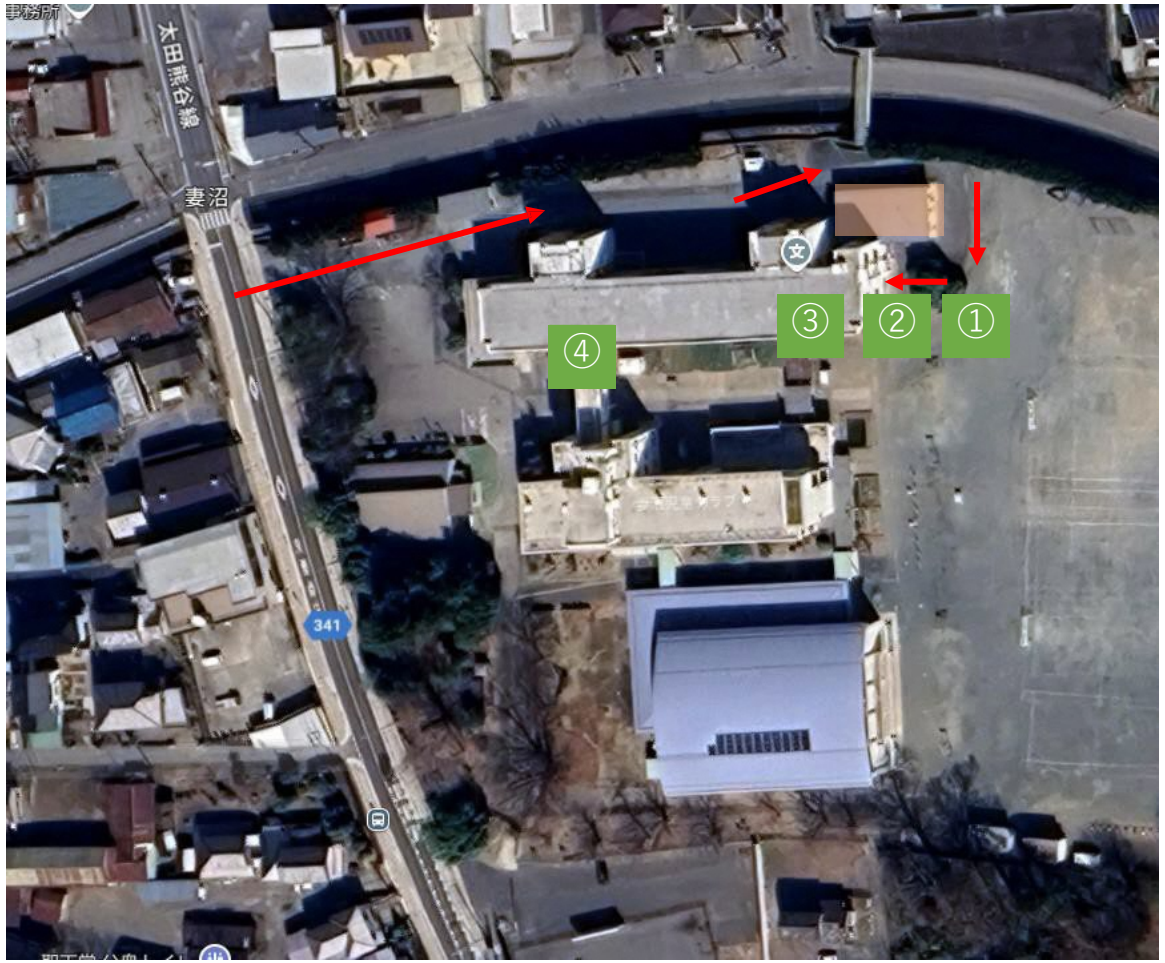


①東面（想定搬入口）



②想定搬入口



③小荷物昇降機

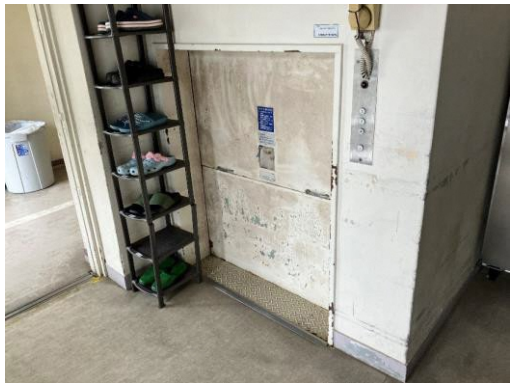



④1階配膳室



凡例	
←	構内車両動線想定
	配膳室範囲

妻沼小学校

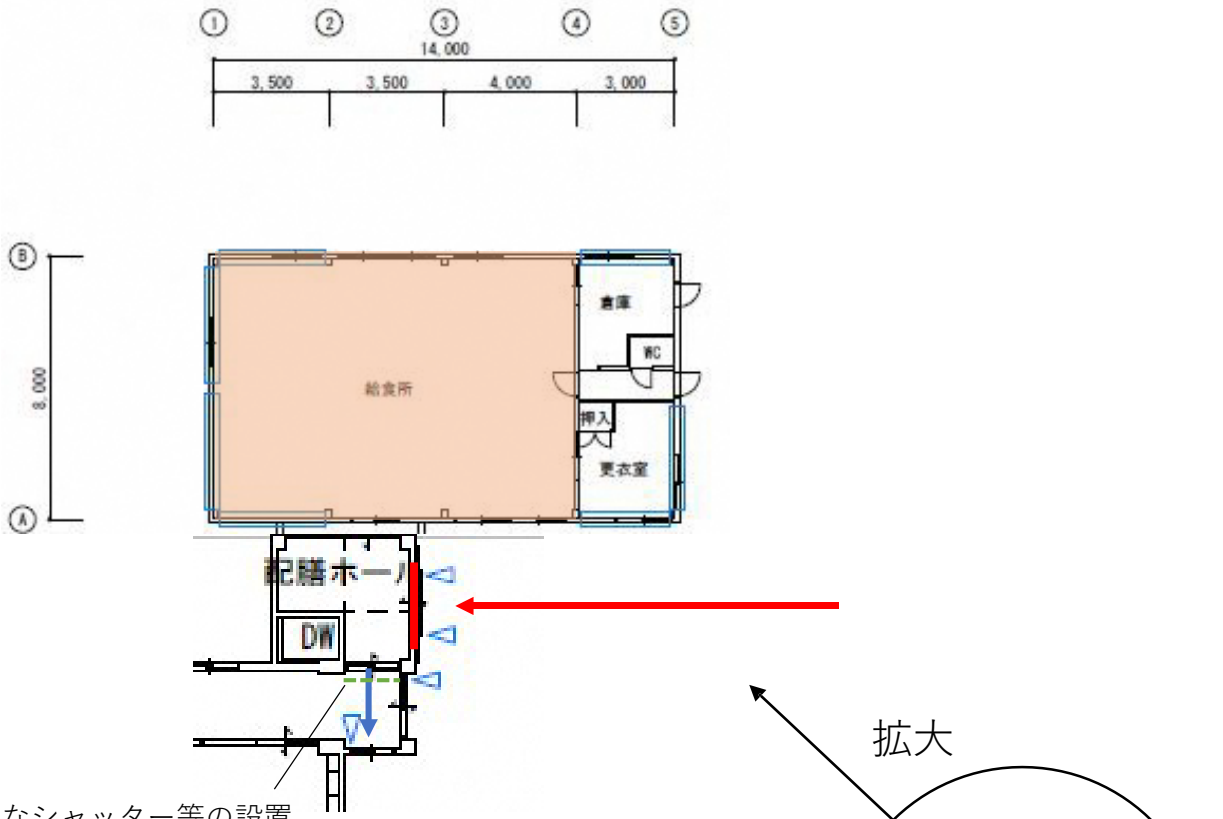

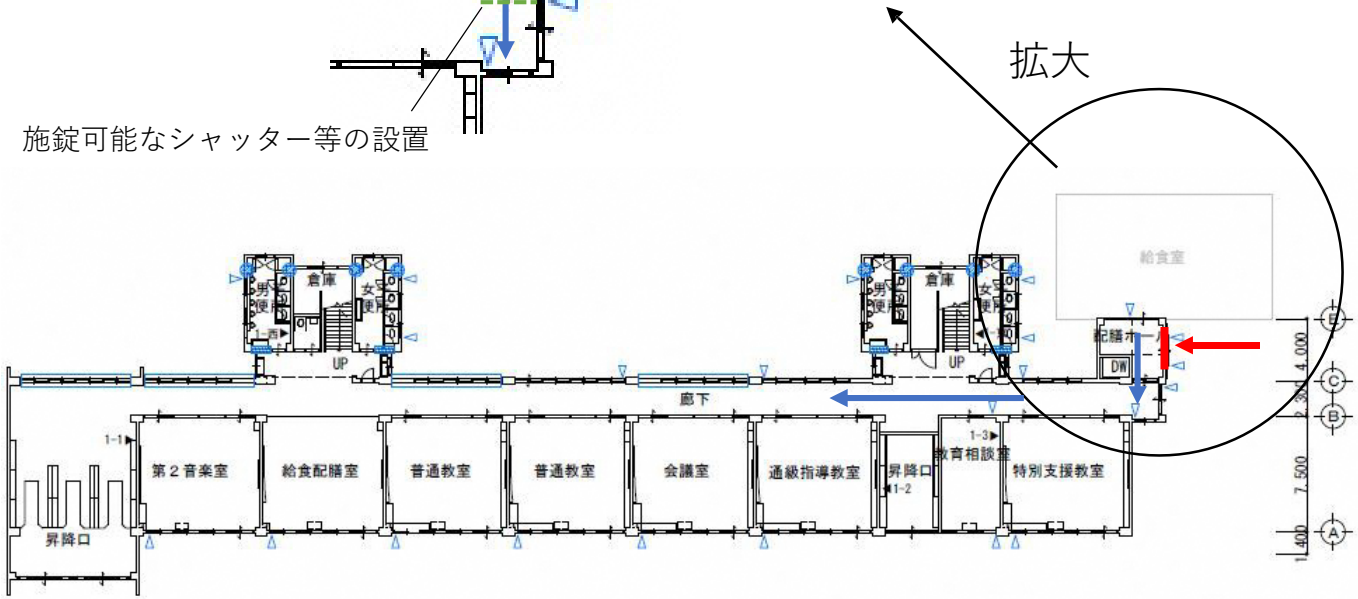

【改修内容】
- 調理室内調理機器等撤去処分
- 施錠可能なシャッター等の設置
- 撤去跡 床等補修
- 搬入路付近樹木剪定（必要に応じて）
- 棚や作業台等は撤去するか再利用するかを改修前に学校と調整して決定すること。

凡例	
	想定コンテナ搬入口
	構内車両動線想定
	配膳室から教室等への動線想定
	配膳室範囲

妻沼西南小学校

現配送校	改修校
	○



①想定搬入口



②現配膳室内消毒保管庫



③現調理室




④現配膳室



凡例	
←	構内車両動線想定
	配膳室範囲

妻沼西南小学校

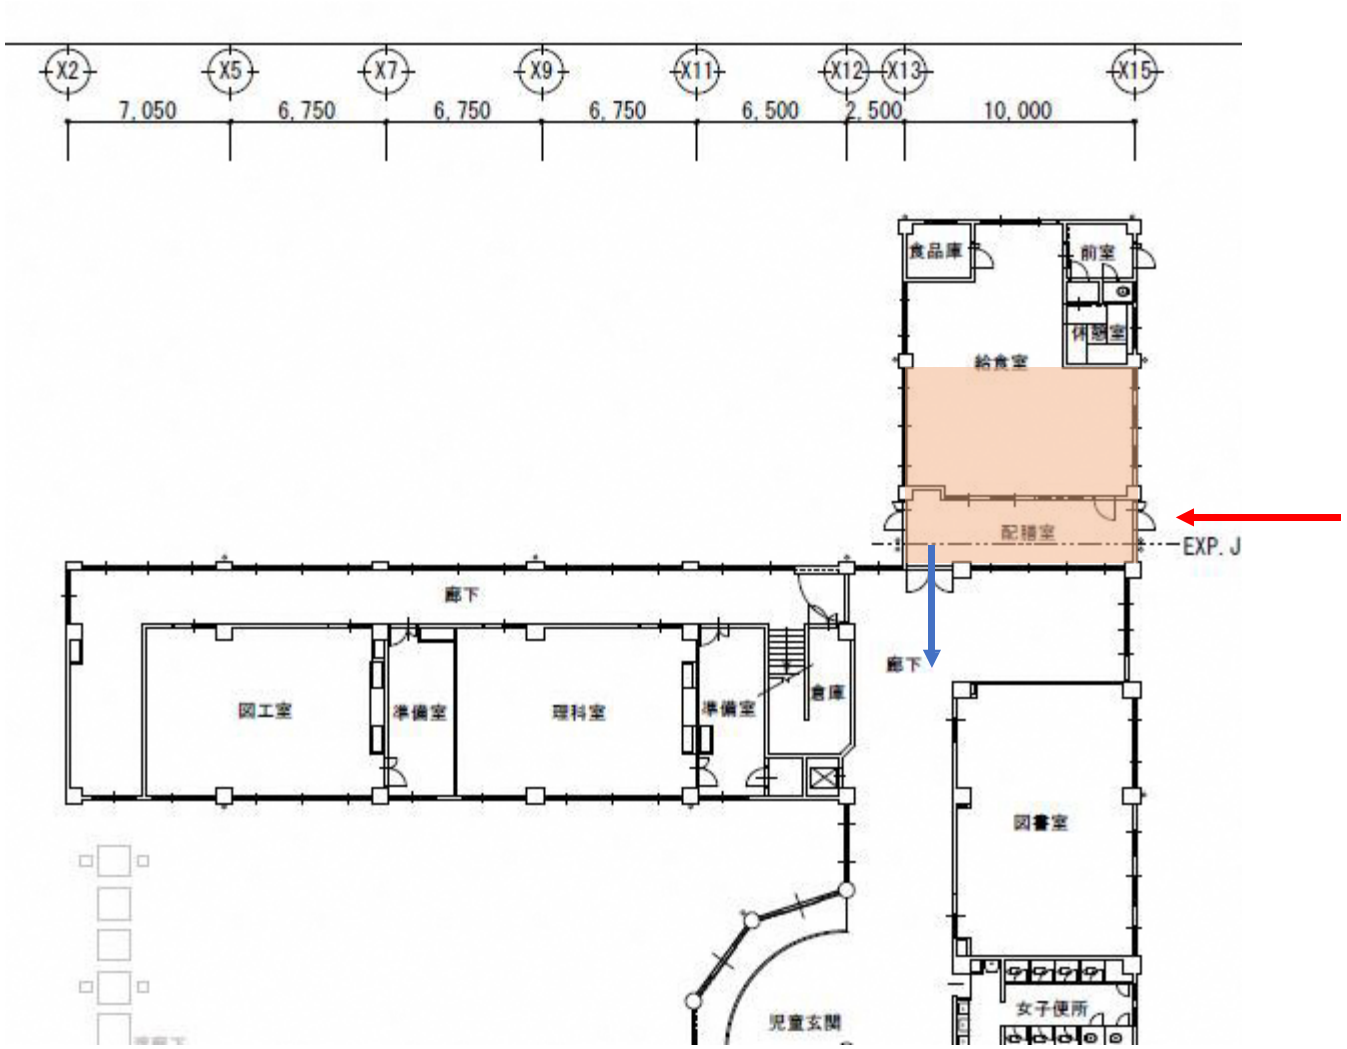

【改修内容】
- 調理室内調理機器等撤去処分
  （消毒保管庫撤去により現給食室内も活用可）
- 搬入口扉・段差改修
- 撤去跡 床等補修
- 棚や作業台等は撤去するか再利用するかを改修前に学校と調整して決定すること。

凡例	
←	構内車両動線想定
←	配膳室から教室等への動線想定
	配膳室範囲

大里中学校

現配送校	改修校
	●（直前の夏） ⊖



①門扉・南面



②南面（想定搬入口）




③現配膳室内



凡例	
←	構内車両動線想定
	配膳室範囲

大里中学校

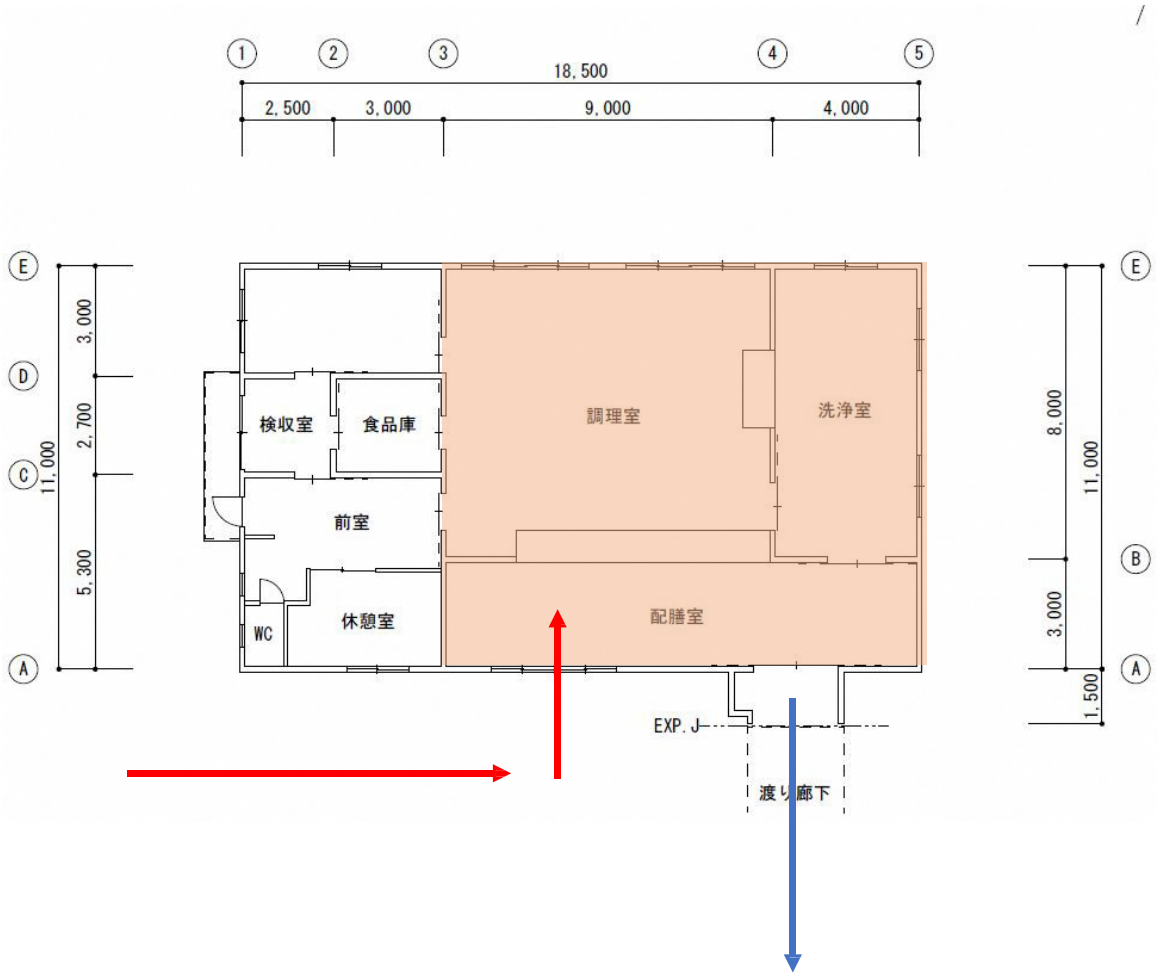

【改修内容】

- 調理室内調理機器等撤去処分
  （消毒保管庫撤去により現給食室内も活用を想定）
- 搬入口扉・段差改修
- 撤去跡 床等補修
- 棚や作業台等は撤去するか再利用するかを改修前に学校と調整して決定すること。

凡例	
←	構内車両動線想定
←	配膳室から教室等への動線想定
	配膳室範囲

妻沼東中学校

現配送校	改修校
	○



①構内進入口



②想定搬入口



③現配膳室内棚




④渡り廊下と配膳室間の建具



凡例	
←	構内車両動線想定
	配膳室範囲

妻沼東中学校

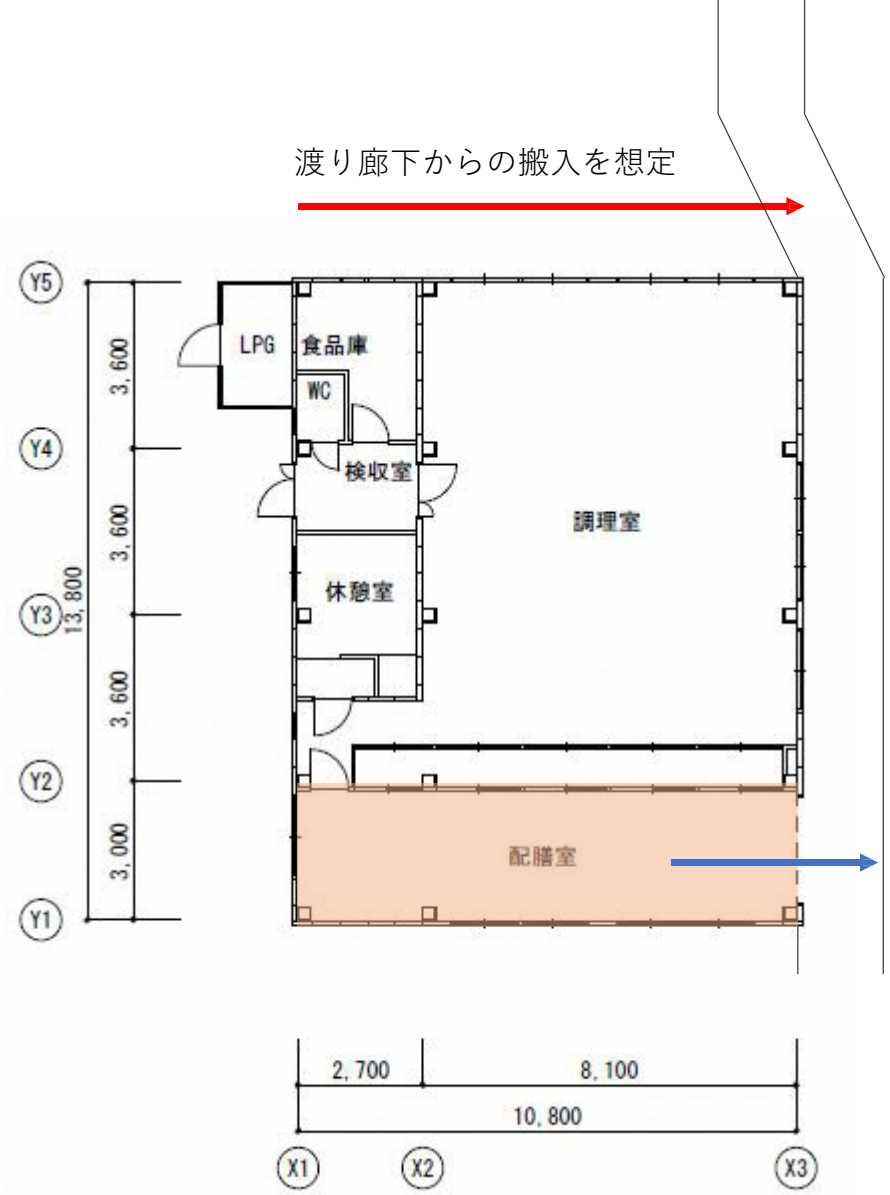

【改修内容】
- 調理室内調理機器等撤去処分
  （消毒保管庫撤去により現給食室内も活用可）
- 搬入口扉・段差改修
- 撤去跡 床等補修
- 棚や作業台等は撤去するか再利用するかを改修前に学校と調整して決定すること。

凡例	
←	構内車両動線想定
←	配膳室から教室等への動線想定
	配膳室範囲

妻沼西中学校

現配送校	改修校
	○



①想定構内進入口



②北面



③想定搬入口



④現配膳室内



凡例	
←	構内車両動線想定
	配膳室範囲

妻沼西中学校



1階平面図　S=1/200

※配膳室西側から搬入することを優先的に検討すること。
西側から搬入できない場合は、妻沼東中学校と同様に
渡り廊下からの搬入を想定する。

【改修内容】
- 調理室内調理機器等撤去処分
  （消毒保管庫撤去により現給食室内も活用可）
- 搬入口扉・段差改修
- 撤去跡 床等補修
- 棚や作業台等は撤去するか再利用するかを改修前に学校と調整して決定すること。

凡例	
←	構内車両動線想定
←	配膳室から教室等への動線想定
	配膳室範囲
